

# Digitalisierung Austrittsprozess USB

---

## Zwischenpräsentation

Von der Projektinitialisierung über die IST-Validierung zur Analysegrundlage für das SOLL-Konzept

# Projektstand und Vorgehen

## Projektphasen, erreichter Stand und nächste Schritte




# Projektstand und Vorgehen

## Phase 1 · Auftrag, Ausgangslage und Rahmenbedingungen



# Ausgangslage und Relevanz

## Digitalisierung der «HR Services»

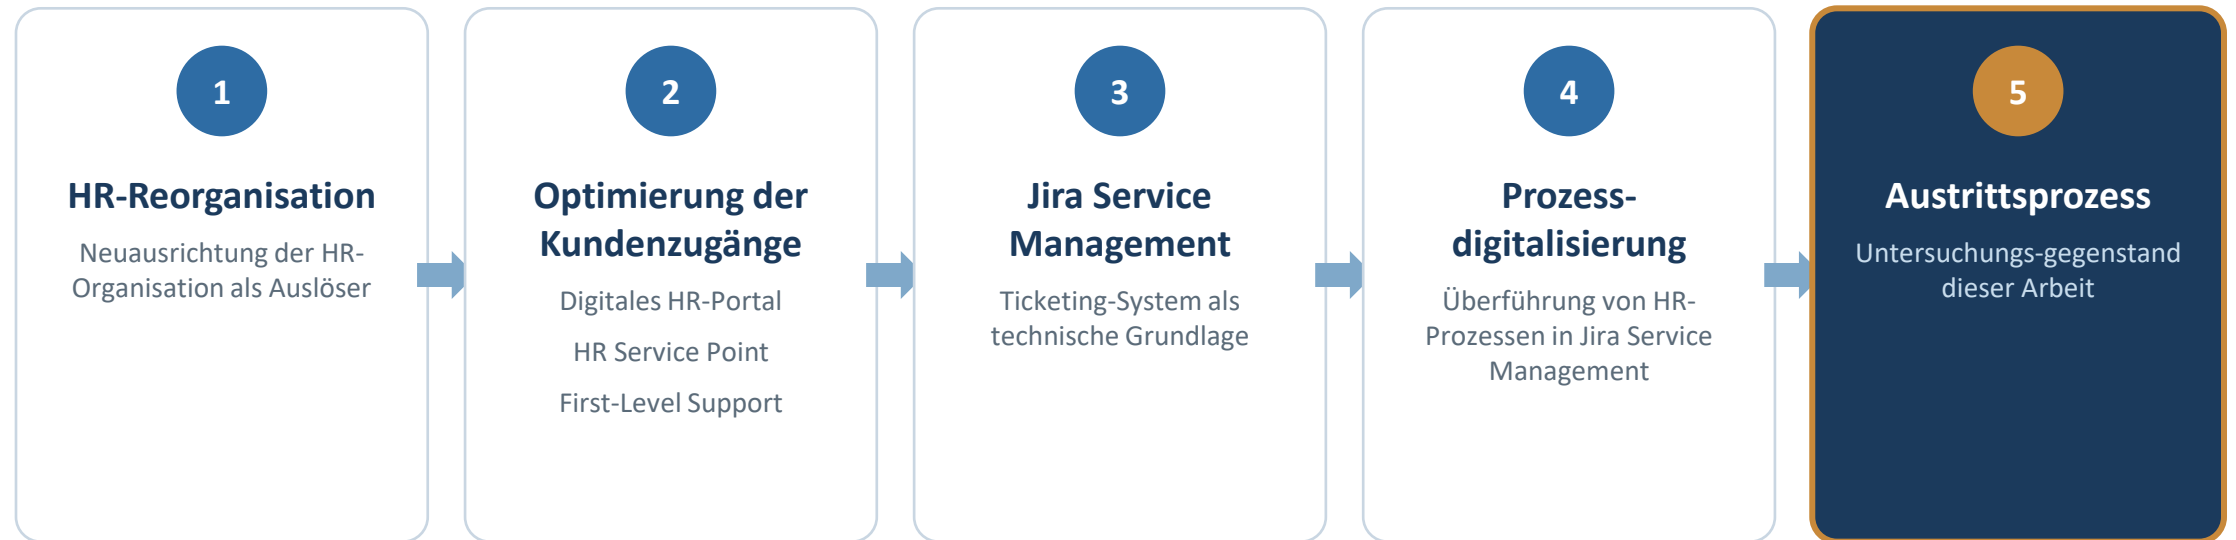

Jira Service Management schafft die technische Grundlage, ersetzt jedoch keine fachliche Standardisierung der Prozesse.

# Zielsetzung und Abgrenzung der Arbeit

Die Entwicklung eines standardisierten, digitalisierungsfähigen SOLL-Austrittsprozessmodells inkl. Anforderungskatalog für die spätere Abbildung im Ticketing-System.

## In Scope

- IST-Erhebung
- IST-Modellierung
- IST-Analyse einschliesslich Pain-Point-Analyse
- SOLL-Konzept
- Anforderungskatalog inkl. User Stories und Use Cases

## Out of Scope

- Technische Spezifikation
- Technische Implementierung
- Technische Systemkonfiguration

## Projektziele

**P1** Medienbrüche reduzieren

**P2** Manuelle, nicht-wertschöpfende Schritte minimieren

**P3** Rollen und Verantwortlichkeiten definieren

**P4** Prozessabläufe standardisieren

# Zielsetzung und Abgrenzung der Arbeit

## Forschungsfrage

Wie muss ein systemgestütztes SOLL-Konzept für den Austrittsprozess des Universitätsspitals Basel gestaltet sein, um Medienbrüche zu reduzieren, manuelle Aufwände zu minimieren und eine transparente sowie nachvollziehbare Prozessabwicklung zu ermöglichen?

# Projektstand und Vorgehen

## Phase 1 · Auftrag, Ausgangslage und Rahmenbedingungen



# Projektstand und Vorgehen


## Phase 1 · Theoretische Basis und methodischer Bezugsrahmen



# Forschungslogik und methodischer Rahmen

DSRM ALS FORSCHUNGSRAHMEN · BPM-LIFECYCLE ALS VORGEHENSMODELL · REQUIREMENTS ENGINEERING ZUR ANFORDERUNGSABLEITUNG

DSRM nach Peffers et al. (2007)

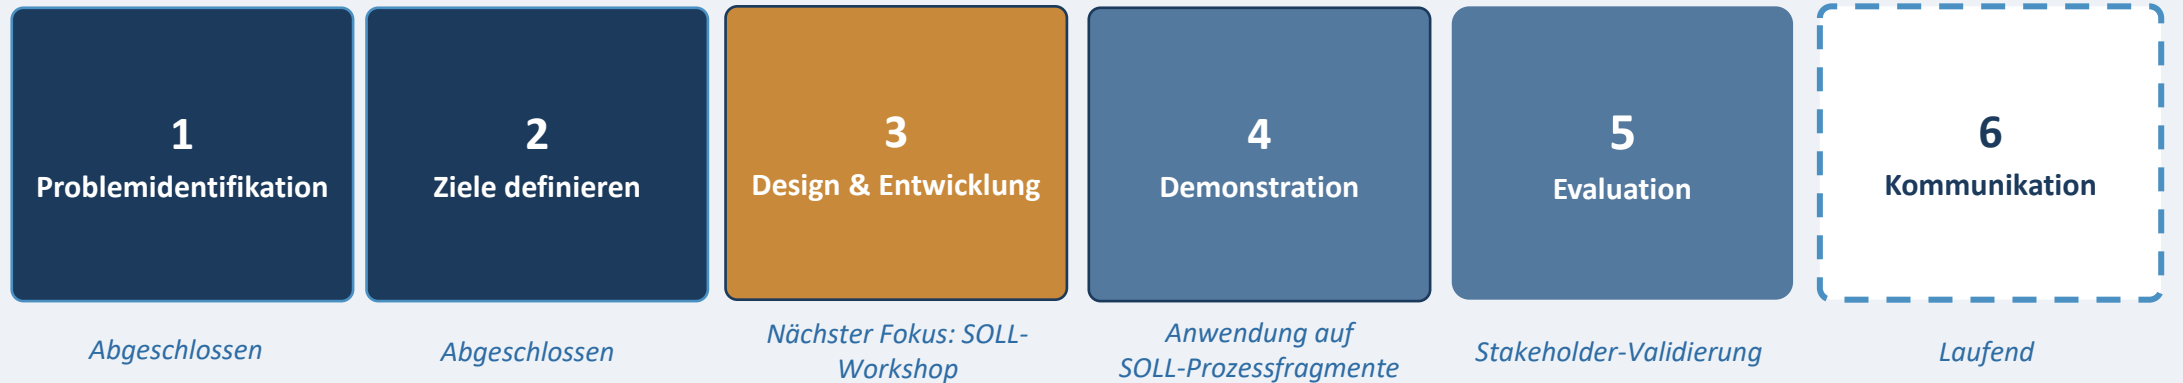

BPM-Lifecycle nach Dumas et al. (2021)

**Prozesserhebung → Prozessanalyse → Prozessdesign**  
IST-Erhebung → IST-Analyse → SOLL-Konzept



Requirements Engineering

**Stakeholder-Analyse → Anforderungsanalyse → Anforderungskatalog**  
Grundlage für Anforderungskatalog, User Stories und Use Cases


# Projektstand und Vorgehen

## Phase 1 · Theoretische Basis und methodischer Bezugsrahmen



# Projektstand und Vorgehen

## Phase 2 · Von den Datenquellen zum validierten IST-Konzept

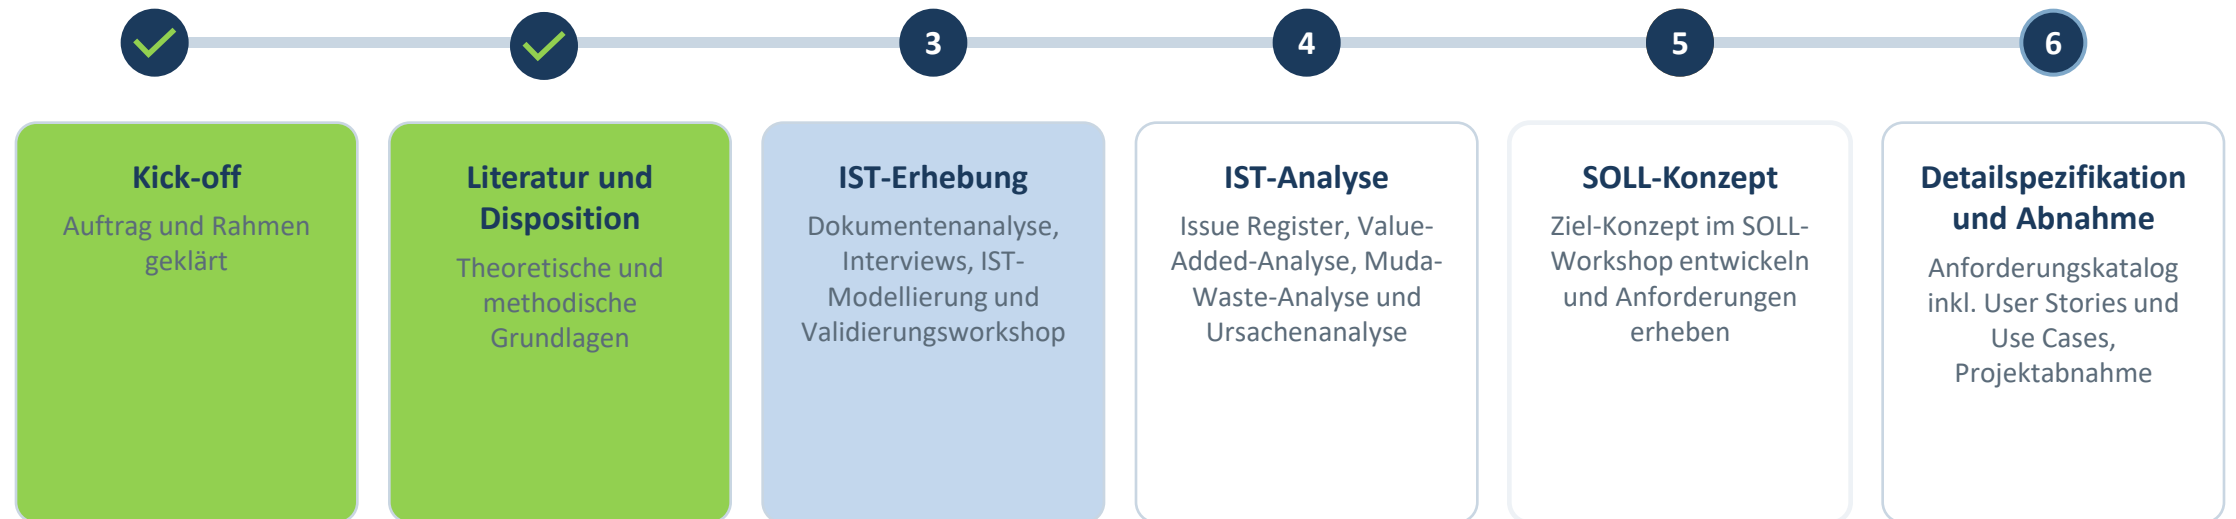

# Evidenzbasis der IST-Erhebung

## ITERATIVE ERHEBUNG UND MODELLIERUNG DES IST-ZUSTANDS

### Evidenzquellen

#### Dokumentenanalyse


Organigramm, Abteilungsbeschreibungen, Prozessdokumentation, Checklisten, Jira-Formulare, Fall-Verfolgung

#### Experteninterviews

Interviewpartner zuvor über eine Stakeholder-Analyse identifiziert; leitfadengestützte Interviews.

Interviewleitfaden Basis – Interview Leitfaden Individuell

### Iterativer Erhebungszyklus



*Rückkopplungszyklus (bei offenen Punkten)*



IST-Konzept

Dokumentenanalyse, Experteninterviews und iterative Modellierung bildeten das IST-Bild.


# Erkenntnisse aus Interviews und Modellierung

Wiederkehrende Grundlogik mit variantenreichen Auslösern und Schnittstellen

## VARIANTEN

### Varianten entstehen früh im Prozess

Austrittsgrund, Anstellungsart und Eingangskanal bestimmen den Start der Bearbeitung.

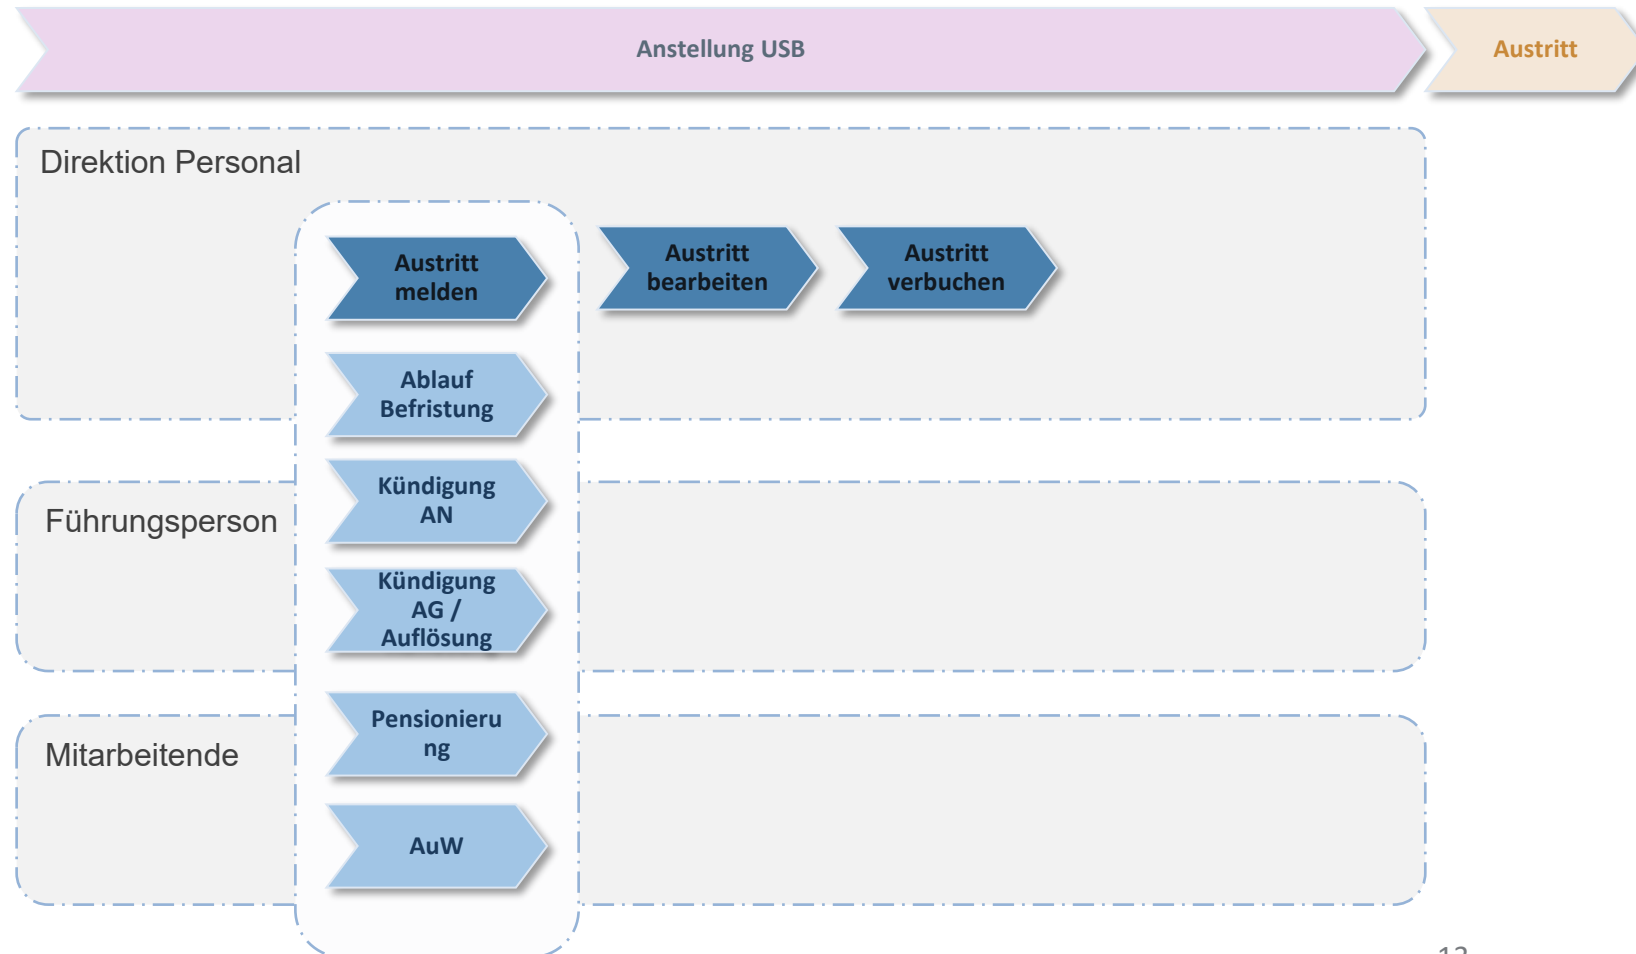

# Erkenntnisse aus Interviews und Modellierung

## Wiederkehrende Grundlogik mit variantenreichen Auslösern und Schnittstellen

### VARIANTEN

#### Varianten entstehen früh im Prozess

Austrittsgrund, Anstellungsart und Eingangskanal bestimmen den Start der Bearbeitung.

### HR ADMINISTRATION

#### HR Administration folgt einer Grundlogik

Die Bearbeitung erfolgt weitgehend über Checklisten, definierte Prüfschritte und Jira-Tickets.

### PAYROLL & TIME MANAGEMENT

#### Payroll und Time Management bearbeiten stabile Teilprozesse

Austrittsbuchung, Saldoprüfung und Auszahlung folgen fachlich wiederkehrenden Mustern.

### KOMPLEXITÄT

#### Komplexität liegt an Schnittstellen und Sonderfällen

Freistellungen, Austrittsschein, Rückzahlungspflichten, Pensionierungen und zeitkritische Austritte erfordern zusätzliche Prüfungen und Abstimmungen.

Die IST-Erhebung zeigte keine vollständig getrennten Einzelprozesse, sondern eine gemeinsame Grundlogik mit variantenabhängigen Einstiegspunkten und vorgelagerten Prozessschritten.

# IST-Konzept

## AUSTRITTSKONSTELLATIONEN IN SECHS PROZESSMODELLEN STRUKTURIERT



Die Variantenvielfalt wurde zur besseren Vergleichbarkeit in sechs fachlich abgegrenzte IST-Prozessmodelle überführt.

# IST-Workshop

## GEMEINSAME VALIDIERUNG DER IST-PROZESSE MIT DEN FACHBEREICHEN

**21.05.2026**

WORKSHOP-DATUM

**9**

TEILNEHMENDE AUS HR FACHBEREICHEN

**2**

ZIELE: VALIDIERUNG + HANDLUNGSFELDER

### Ziele des Workshops

- Durchsicht IST-Prozess(e)
- Pain Points und Handlungsfelder identifizieren

### Ergebnisse

#### IST-Prozesse validiert

Die sechs Prozessmodelle sind bestätigt – «so arbeiten wir heute».

#### Pain Points und Handlungsfelder

Optimierungspotenziale aufgenommen und in vier Handlungsfelder überführt.

Der Workshop validierte die sechs IST-Prozessmodelle und bildet die fachlich gesicherte Grundlage für die anschliessende Erarbeitung eines SOLL-Konzepts.

# Vier identifizierte Handlungsfelder

## ZIELRICHTUNG FÜR DAS SOLL-KONZEPT

### 1 **Transparenz und operative Steuerung**

- Bearbeitungsstand jederzeit nachvollziehbar
- Offene Aufgaben, Rollen, Prioritäten und Fälligkeiten fallbezogen und übergreifend sichtbar

### 2 **Konsistente Datenbasis und Systemintegration**

- Informationen vollständig und konsistent vorhanden
- Daten einmalig erfasst und systemübergreifend weiterverwendet
- Übergaben strukturiert und dokumentiert

### 3 **Standardisierung und Prozessdokumentation**

- Wiederkehrende Fälle folgen einheitlicher Bearbeitungslogik
- Varianten werden klar unterschieden, Sonderfälle anhand definierter Kriterien erkannt und Rollen dokumentiert.

### 4 **Systemgestützte Prozessausführung**

- Aufgaben, Prüfungen, Übergaben und Entscheidungen systemgestützt geführt
- Aufgaben werden regelbasiert ausgelöst und zentral dokumentiert; Formulare (falls im SOLL vorhanden) sind in den Prozess eingebettet.

# 18 konsolidierte Pain Points aus der IST-Erhebung

Zuordnung zu den vier Handlungsfeldern als Grundlage für die IST-Analyse



**HF-03** weist Querbezüge zu den übrigen Handlungsfeldern auf!

## HF-01 Transparenz und operative Steuerung

**PP-01** Fehlende zentrale Übersicht über den Bearbeitungsstand

**PP-05** Unklare Verantwortlichkeiten bei Rückzahlungspflichten

**PP-06** Fehlende Frühinformation an HR Payroll bei zeitkritischen Austritten

## HF-02 Konsistente Datenbasis und Systemintegration

**PP-02** Unvollständige oder uneinheitliche Ticketinformationen

**PP-03** Uneinheitlicher Prozesseingang, Risiko von Doppeltickets

**PP-07** Manuelle Übertragung von SAP-Stammdaten in Jira

**PP-10** SharePoint-Liste im AuW-Prozess ohne Jira-Anbindung

**PP-15** Saldoabweichungen zwischen Austrittsschein und PEP

**PP-16** Manuelle VSAO-Abmeldung bei ärztlichen Anstellungen

## HF-03 Standardisierung und Prozessdokumentation

**PP-12** Unklare Regelung zu Arbeitszeugnis oder -bestätigung

**PP-13** Manuelle Prüfungen mit begrenztem fachlichem Nutzen

## HF-04 Systemgestützte Prozessausführung

**PP-04** Austrittsschein nicht in die Ticketbearbeitung integriert

**PP-08** Späte Durchführung von Sonderfallprüfungen

**PP-09** Uneinheitlicher Informationsweg bei Freistellungen

**PP-11** Redundante Auflösungsabwicklung bei AuW-Nichtbestehen

**PP-14** Keine strukturierte Abbildung von Varianten und Sonderfällen


**PP-17** Manueller Abschluss des SAP-Fiori-Workflows (Ablauf Fonds/ZTP ..)

**PP-18** Pensionierung nicht strukturiert in Jira erfasst

Die Pain Points verdichten sich zu vier Problembereichen: fehlende Transparenz, inkonsistente Datenbasis, uneinheitliche Standardisierung und unzureichende systemgestützte Prozessausführung. Diese Handlungsfelder bilden die Grundlage für das SOLL-Konzept.

# Projektstand und Vorgehen

## Phase 2 · Von den Datenquellen zum validierten IST-Konzept

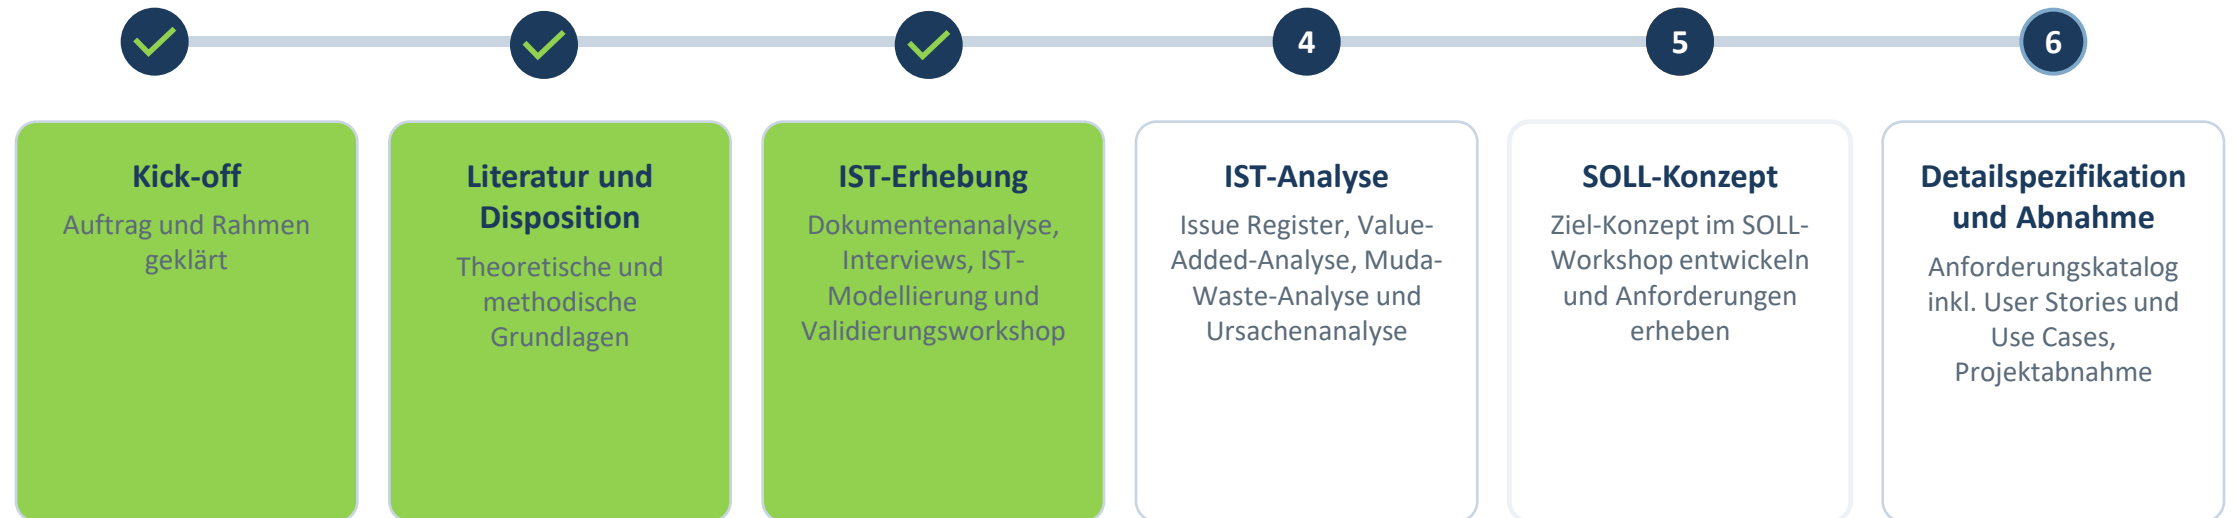


# Projektstand und Vorgehen

## Phase 3 · Von erhobenen Pain Points zu bestätigten Handlungsfeldern



# IST-Analyse

## Vom Issue Register zur Grundlage des SOLL-Konzepts

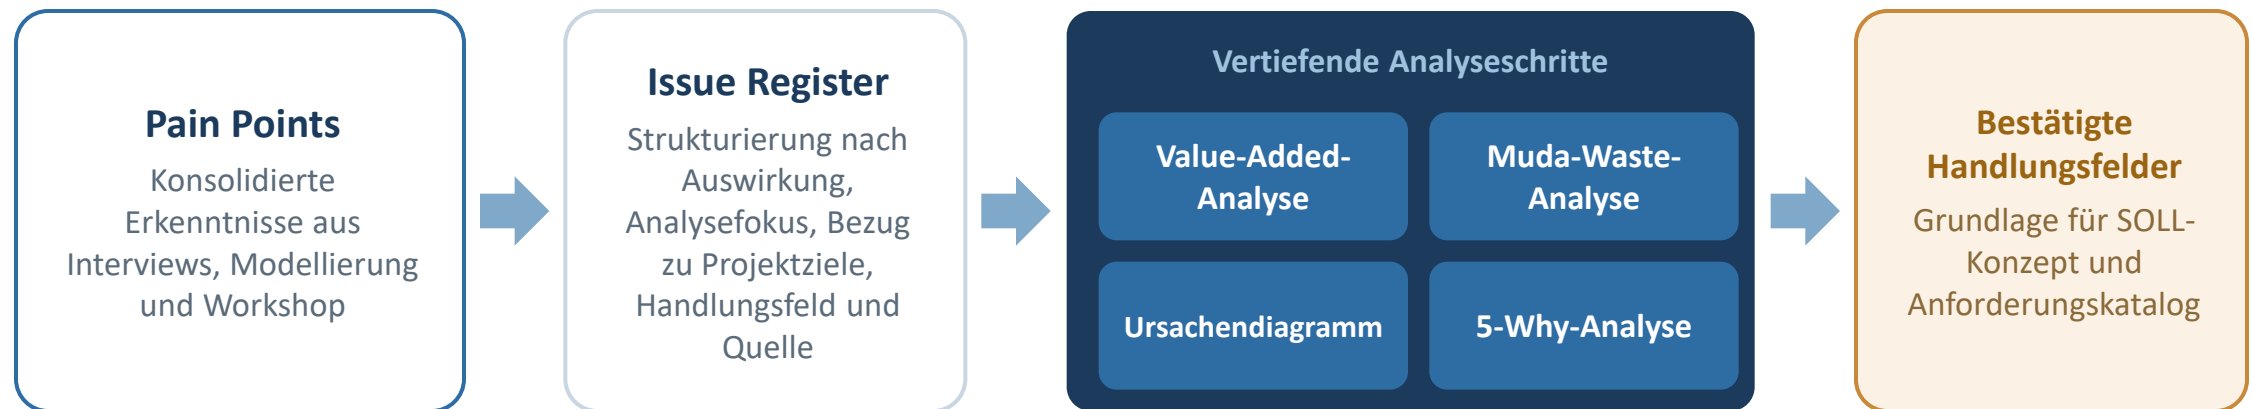

### Vorgehen:

IST-Workshop: Handlungsfelder festgelegt · IST-Analyse: Pain Points strukturiert, methodisch geprüft und Handlungsfelder bestätigt.



Die IST-Analyse bestätigt die vier Handlungsfelder als fachliche Grundlage für das SOLL-Konzept.

# Value-Added-Analyse

Welche Prozessschritte erzeugen einen direkten Nutzen, welche sind nur intern notwendig, und welche erzeugen keinen sinnvollen Beitrag?

## Methode und Anwendung

Klassifiziert Prozessschritte nach ihrem Wertbeitrag:

- **WS** – wertschöpfend (kundenseitig)
- **GWS** – geschäftswertschöpfend
- **NWS** – nicht wertschöpfend

### Anwendung

Angewendet am Referenzmodell «Vertragsablauf USB/Fonds»

### Annahme

Als administrativer Pflichtprozess wurde ein hoher GWS-Anteil erwartet.

## Ergebnisverteilung

38 Prozessschritte insgesamt



### WS

wertschöpfend  
(kundenseitig)

3

7.9 %

### GWS

geschäftswert-  
schöpfend

29

76.3 %

### NWS

nicht  
wertschöpfend

6

15.8 %

## Interpretation für das SOLL-Konzept

### Interpretation

Hoher GWS-Anteil, da viele Schritte für Prüfung, Dokumentation und Nachvollziehbarkeit erforderlich sind.

### Einordnung der Methode

Die NWS-Schritte verweisen auf bereits identifizierte Pain Points. Die Methode grenzt den Optimierungsfokus ein.

### SOLL-Konsequenz

**Fokus nicht auf Elimination, sondern auf strukturierte und systemgestützte Ausführung.**



**Die Value-Added-Analyse zeigt:** Nicht die Tätigkeit an sich ist überwiegend problematisch, sondern ihre manuelle, verteilte oder nicht systemgestützte Ausführung.

# Muda-Waste-Analyse

## Einordnung der Pain Points nach dominierender Verschwendungsart

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Überanstrengung</b><br>(Mehraufwand, Fehler) <b>9<sup>PP</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Bewegung</b><br>(Transport, Lange Wege) <b>6<sup>PP</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Halten</b><br>(Inventar, Wartezeit) <b>3<sup>PP</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Zusatzaufwand durch manuelle Prüfungen, Rückfragen, Nacharbeit und redundante Bearbeitung.</p> <p><b>BEISPIELE</b></p> <p><b>PP-08</b> Späte Sonderfallprüfungen<br/><b>PP-13</b> Manuelle Prüfungen mit begrenztem Nutzen<br/><b>PP-11</b> Redundante Auflösung bei AuW-Nichtbestehen</p> <p><b>ADRESSIERT DURCH</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ HF-03 Standardisierung &amp; Dokumentation</li><li>▶ HF-04 Systemgestützte Prozessführung</li></ul> | <p>Verschwendung durch Systemwechsel, Medienbrüche, manuelle Übertragung und verteilte Datenquellen.</p> <p><b>BEISPIELE</b></p> <p><b>PP-07</b> SAP-Stammdaten manuell in Jira<br/><b>PP-04</b> Austrittsschein nicht in Ticket integriert<br/><b>PP-10</b> SharePoint-Liste ohne Jira-Anbindung</p> <p><b>ADRESSIERT DURCH</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ HF-02 Konsistente Datenbasis &amp; Integration</li><li>▶ HF-04 Systemgestützte Prozessführung</li></ul> | <p>Verschwendung durch Wartezeiten, Pendenzen und verzögerte Weiterverarbeitung.</p> <p><b>BEISPIELE</b></p> <p><b>PP-01</b> Fehlende zentrale Übersicht über den Bearbeitungsstand<br/><b>PP-06</b> Fehlende Frühinformation an HR Payroll<br/><b>PP-05</b> Unklare Verantwortlichkeiten bei Rückzahlung</p> <p><b>ADRESSIERT DURCH</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ HF-01 Transparenz &amp; operative Steuerung</li><li>▶ HF-02 Konsistente Datenbasis &amp; Integration</li></ul> |



**Die Muda-Waste-Analyse zeigt:** Das zentrale Optimierungspotenzial liegt in der Reduktion manueller Koordination, redundanter Bearbeitung und systembedingter Medienbrüche.

# Ursache-Wirkungsanalyse

Die Analyse prüft, ob die Handlungsfelder die Ursachen der Pain-Point-Gruppen adressieren, und leitet daraus die Richtung für das SOLL-Konzept ab.

## HF-01 Transparenz und operative Steuerung

### URSACHE

Status, Fristen, Prioritäten und Zuständigkeiten sind nicht durchgängig systemseitig abgebildet.

### SOLL-FOKUS

- Übersicht über alle Austritte inkl. Stand, Zuständigkeit, Priorität, Fälligkeit
- Filter- und Priorisierungslogik für zeitkritische Fälle

**WIRKUNG** Adressiert fehlende Übersicht und unklare Steuerung.

## HF-02 Konsistente Datenbasis und Systemintegration

### URSACHE

Prozessinformationen liegen verteilt vor; Datenquellen und Datenübernahmen sind nicht eindeutig definiert.

### SOLL-FOKUS

- Zentrale Fallführung und Dokumentation je Austritt
- Verbindliche Datenquellen und Pflichtinfos je Falltyp
- Daten systemübergreifend nutzen (SAP/Umsysteme ↔ Jira)

**WIRKUNG** Adressiert Medienbrüche, Dateninkonsistenzen und redundante Erfassung.

## HF-03 Standardisierung und Prozessdokumentation

### URSACHE

Bearbeitungsregeln, Entscheidungskriterien und Prüfungen sind nicht für alle Prozessvarianten eindeutig definiert.

### SOLL-FOKUS

- Prozessdoku inkl. Rollen, Rückfrage- und Übergabewege
- Prozessvarianten auf notwendige Ausnahmen begrenzen
- Standardkriterien und Pflichtschritte je Variante

**WIRKUNG** Adressiert Interpretationsspielräume und uneinheitliche Bearbeitung.

## HF-04 Systemgestützte Prozessausführung

### URSACHE

Prozessschritte, Prüfungen, Informationen und Varianten sind nicht durchgängig in einer systemgestützten Workflow-Logik abgebildet.

### SOLL-FOKUS

- Aufgaben, Prüfungen, Übergaben systemgestützt führen
- Sinnvolle Prüfungen regelbasiert/automatisiert auslösen
- Varianten und Sonderfälle früh systemgestützt erkennen

**WIRKUNG** Adressiert manuelle Koordination und späte Prüfungen.

# 5-Why-Analyse

## Ausgewählte Pain Points vertiefen und Ursachenstruktur präzisieren

### PP-07 Manuelle Übertragung von SAP-Stammdaten in Jira

#### PROBLEM

SAP-Stammdaten werden manuell in Jira übertragen.

#### VERTIEFTE URSACHE

SAP-Stammdaten sind im Austrittsprozess nicht systemgestützt mit dem Jira-Ticket verknüpft. Dadurch fehlt eine definierte Datenübernahme für relevante Personen- und Anstellungsdaten.

**PRÄZISIERUNG** Fehlende Schnittstelle bzw. fehlende automatisierte Datenübernahme zwischen SAP und Jira.

BESTÄTIGTE HANDLUNGSFELDER

HF-02

HF-04

### PP-14 Fehlende strukturierte Abbildung von Varianten und Sonderfällen

#### PROBLEM

Varianten und Sonderfälle werden nicht durchgängig strukturiert im Austrittsticket abgebildet.

#### VERTIEFTE URSACHE

Varianten und Sonderfälle sind im Ticketdesign nicht als steuernde Prozesslogik abgebildet. Dadurch werden notwendige Prüfungen und Folgeaufgaben nicht regelbasiert ausgelöst.

**PRÄZISIERUNG** Fehlende regelbasierte Varianten-, Prüf- und Aufgabensteuerung im Prozess- und Ticketdesign.

BESTÄTIGTE HANDLUNGSFELDER

HF-03

HF-04



Die 5-Why-Analyse bestätigt die Ursachenlogik der Handlungsfelder. Eine Ausweitung auf alle Pain Points ist deshalb nicht erforderlich.

# Projektstand und Vorgehen

## Phase 3 · Von erhobenen Pain Points zu bestätigten Handlungsfeldern



# Projektstand und Vorgehen

## Phase 3 · Von erhobenen Pain Points zu bestätigten Handlungsfeldern




# Projektstand und Vorgehen

Nächster Schritt: Überführung der Handlungsfelder in das SOLL-Konzept



# Ausblick

## NÄCHSTE SCHRITTE BIS ZUR PROJEKTABNAHME

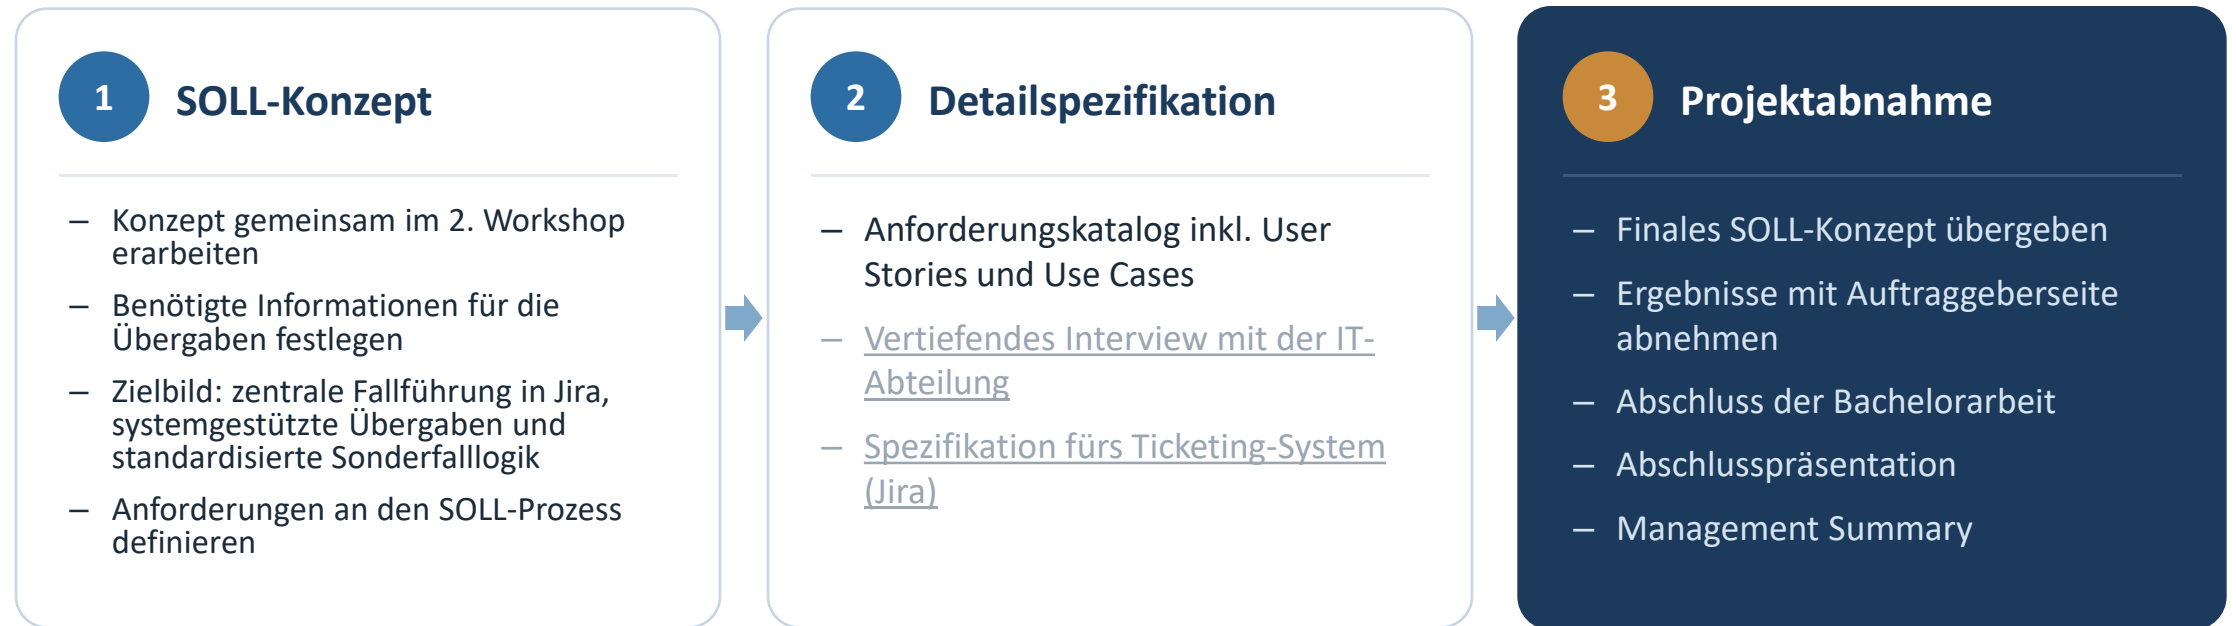

**TAKE-AWAY** Die IST-Prozesse sind erhoben, mit den Fachbereichen validiert und analysiert. Die vier Handlungsfelder zeigen klar, worauf das SOLL-Konzept ausgerichtet werden muss: weniger Medienbrüche, weniger manuelle Aufwände und mehr Transparenz im Austrittsprozess.

# Ausblick

**TAKE-AWAY** Die IST-Prozesse sind erhoben, mit den Fachbereichen validiert und analysiert. Die vier Handlungsfelder zeigen klar, worauf das SOLL-Konzept ausgerichtet werden muss: weniger Medienbrüche, weniger manuelle Aufwände und mehr Transparenz im Austrittsprozess.



Der nächste Meilenstein ist der gemeinsame SOLL-Workshop zur Erarbeitung des Grobkonzepts.

# Herausforderungen im Projektverlauf

## Zentrale Herausforderungen und Lerneffekte

### HERAUSFORDERUNG 1

#### **Iterative Konkretisierung des IST-Prozesses**

Prozesswissen wurde nicht immer vollständig in einem Schritt sichtbar.

#### **Retrospektive:**

Eine gemeinsame Prozesslandkarte in einer frühen Projektphase hätte Schnittstellen und offene Punkte früher sichtbar gemacht. Interviews könnten darauf aufbauend gezielter auf Übergaben und Abhängigkeiten ausgerichtet werden.

### HERAUSFORDERUNG 2

#### **Widersprüchliche Interviewaussagen**

Unterschiedliche Rollen beschrieben den Prozess aus ihrer jeweiligen Zuständigkeit. Dadurch entstanden abweichende Aussagen zu Übergabe und Verantwortlichkeiten.

#### **Retrospektive:**

Prozessdetails waren nicht bei allen Rollen gleich präsent. Eine vorgängige Groberhebung hätte geholfen, abweichende Aussagen gezielter einzuordnen und nachzufragen.

### HERAUSFORDERUNG 3

#### **Gemeinsame Terminfindung**

Abstimmung über viele Beteiligte und Fachbereiche hinweg war anspruchsvoll.

#### **Retrospektive:**

Zentrale Termine hätten früher verbindlich blockiert werden sollen. Bei Workshops mit mehreren Fachbereichen wären zusätzliche Ausweichtermine sinnvoll gewesen.

# Projektsteuerung und Zusammenarbeit

## ENGE BEGLEITUNG DURCH AUFTRAGGEBERSEITE UND FHNW

### Projektsteuerung und Rollen



**Kathrin Kühnle**

**Leiterin HR Administration und Process Owner**

Fachliche Steuerung und Abnahme der Arbeit.



**Sarah Haefliger**

**Projektleiterin HR Digitalisierung**

Zentrale Ansprechperson der Auftraggeberschaft.



**Dr. Felix Härer**

**Fachdozent FHNW**

Wissenschaftliche Betreuung der Arbeit.

### Zusammenarbeit



#### **Sehr starke Unterstützung**

Kontinuierliche fachliche und organisatorische Begleitung durch Kathrin Kühnle und Sarah Haefliger.



#### **Hohe Mitwirkungsbereitschaft**

Alle Interview- und Workshop-Partner waren stets motiviert und hilfsbereit.



#### **Regelmässiger Austausch mit Fachdozenten**

Regelmässige Abstimmungen mit Felix dienten der Überprüfung des Vorgehens, der methodischen Einordnung und der wissenschaftlichen Qualität.

# Feedback und Diskussion

---

Rückmeldungen zu folgenden Punkten sind besonders hilfreich:

## **PRÄSENTATION UND PROJEKTSTAND**

Wird aus der Präsentation klar, was bisher erarbeitet wurde und wo das Projekt aktuell steht?

## **PROJEKTKURS UND VORGEHEN**

Bin ich aus eurer Sicht fachlich und methodisch auf dem richtigen Weg?

## **KOMMUNIKATION UND ZUSAMMENARBEIT**

Sind Abstimmung, Kommunikation und Informationsstand für euch ausreichend und hilfreich?

## **WEITERES VORGEHEN BIS ZUM SOLL-WORKSHOP**

Vorschläge zur Vorbereitung von SOLL-Varianten und Anforderungen



Vielen Dank für eure  
Aufmerksamkeit  
und die bisherige  
Zusammenarbeit!

